FASE 1
CRAVAÇÃO DAS ESTACAS METÁLICAS E CONTRAVENTAMENTO

FASE 2
ARMAÇÃO E CONCRETAGEM DO PLUGUE DE CONCRETO
(1ª fase da concretagem in loco)

FASE 3
POSICIONAMENTO DOS CAPITEIS - PM

FASE 4
CONCRETAGEM DA CONSOLIDAÇÃO DOS CAPITEIS
(2ª fase da concretagem in loco)

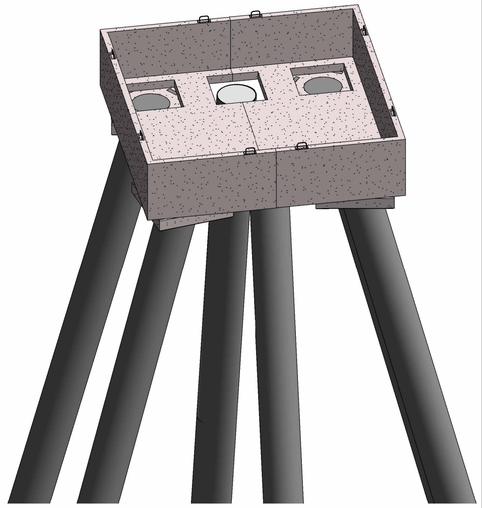

FASE 5
POSICIONAMENTO DOS PRÉ-MOLDADOS

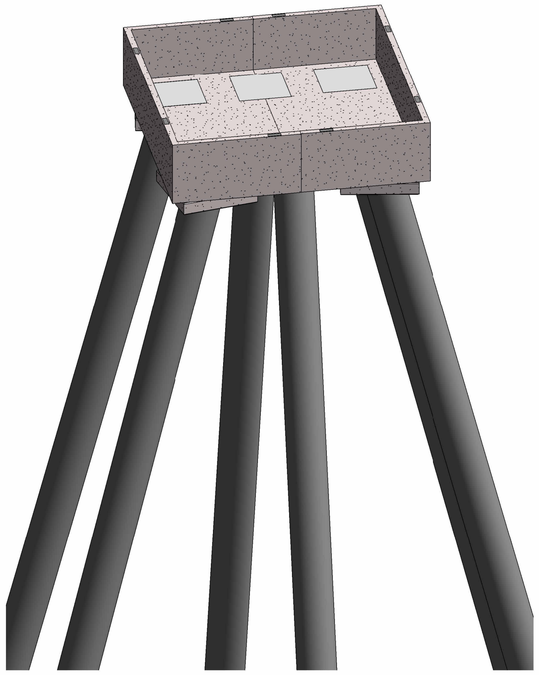

FASE 6
FÔRMA, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM DA CONSOLIDAÇÃO DOS PRÉ-MOLDADOS
(3ª fase da concretagem in loco)

FASE 7
POSICIONAMENTO DOS CHUMBADORES DOS CABEÇOS DE AMARRAÇÃO, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM DA LAJE

FASE 8
POSICIONAMENTO DOS CHUMBADORES DA PASSARELA METÁLICA, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM DA LAJE

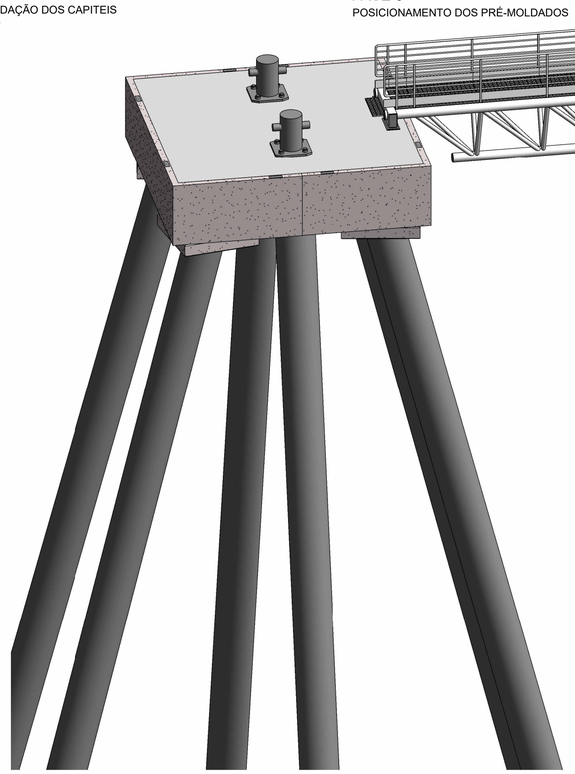

FASE 9
POSICIONAMENTO E FIXAÇÃO DOS CABEÇOS DE AMARRAÇÃO E PASSARELA METÁLICA

ANDRE MARQUES:02976157936

Assinado de forma digital por ANDRE MARQUES:02976157936
Dados: 2022.12.07 10:46:38 -03'00'

1. TODAS AS ESTACAS POSSUEM INCLINAÇÃO 1:4;.
2. AS ALÇAS DE IÇAMENTO DEVERÃO SER REMOVIDAS APÓS O POSICIONAMENTO FINAL DAS PEÇAS E O SEU NICHO PREENCHIDO COM GROUT.

NOTAS

LEGENDAS

1- IFS-2220-220-C-DE-00001
2- IFS-2220-220-C-DE-00002
3- IFS-2220-220-C-DE-00003
4- IFS-2220-220-C-DE-00007

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

REV.	TE.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
0	B	EMISSÃO INICIAL	01/12/2022	DM	CB	AM

TIPO DE EMISSÃO: (A) PRELIMINAR; (B) PARA COMENTÁRIOS; (C) PARA CONHECIMENTO; (D) PARA COTAÇÃO; (E) PARA CONSTRUÇÃO; (F) CONFORME COMPRADO; (G) CONFORME CONSTRUÍDO; (H) CANCELADO; (I) APROVADO

CONTROLE DE REVISÕES

SOMAR PORTO DE IMBITUBA

INFRAS ENGENHARIA

PROJETO BÁSICO
PORTO DE IMBITUBA - AMPLIAÇÃO
DOLFIM DE AMARRAÇÃO
SEQUÊNCIA EXECUTIVA

NÚMERO INFRAS:	NÚMERO CLIENTES:	ESCALA:	REVISÃO:
IFS-2220-220-C-DE-00004		S/ESC	0
